

Hodnotící zpráva k Akčnímu plánu rozvoje obce na r. 2022

Rozvojový plán obce Hvozdnice na r. 2021-2030



Předkládá: Jan Špicar - starosta obce

Zpracovali: Ivan Machala - zastupitel

David Pekáč – místostarosta obce

Hvozdnice 15. února 2023

Obsah

| | |
|---|---|
| Úvod..... | 2 |
| Cíl..... | 2 |
| Forma | 2 |
| Realizace hodnocení..... | 3 |
| Vstupy..... | 3 |
| Způsob zpracování..... | 3 |
| Rekapitulace priorit dle Rozvojového plánu obce na r. 2021-30 | 3 |
| Hodnocení plnění Akčního plánu rozvoje obce na r. 2022..... | 4 |
| Detailní hodnotící tabulka (plnění k 31.12.2022)..... | 4 |
| Záměry pro zařazení do AP 2023 v souladu s RPO 2021-30 | 5 |
| Zdroje..... | 5 |
| Zkratky..... | 6 |

Úvod

Rozvojový plán obce Hvozdnice (dále jen "RPO") pro období 2021–2030 byl schválen usnesením zastupitelstva obce ze dne 27.10.2021. Je střednědobým strategickým plánem, který formuluje nejpodstatnější otázky dalšího směřování obce a vymezuje nejdůležitější cíle a rozvojové změny. Pro zajištění plnění priorit a záměrů je v rámci správy RPO každoročně sestavován Akční plán rozvoje obce (dále jen „AP“), ve kterém jsou uvedeny aktivity pro daný rok. Důvodem je detailnější a koordinovanější přístup k rozvoji obce, zkvalitnění způsobu jejího řízení a dosažení hlavního cíle RPO – zlepšení a zpříjemnění života obyvatel obce. A právě dokument AP, resp. stav v plnění záměrů a projektů v něm obsažených, je předmětem hodnocení v této zprávě.

Cíl

Posoudit, zda realizací aktivit a opatření bylo dosaženo plánovaných cílů stanovených v AP pro r. 2022.

Forma

Výstupem provedeného hodnocení je tato hodnotící zpráva, která představuje zpětnou vazbu o plnění AP pro daný rok. Monitoruje naplňování aktivit AP prostřednictvím jednoduché tabulky, ve které se slovním vyjádřením "plněno", "částečně plněno" či "nesplněno" hodnotí způsob plnění jednotlivých aktivit, případně doplněný komentář popisuje detailněji stávající situaci a event. uvádí i návrhy na opatření. Nedílnou součástí Hodnotící zprávy je i popis záměrů, které nakonec nemohly být v příslušném roce naplněny, resp. mohou být jako nové navrhovány pro nadcházející roční období.

Realizace hodnocení

Vstupy

| | |
|--------------------------|--|
| Název | Rozvojový plán obce Hvozdnice na r. 2021-2030 |
| Gestor | Starosta obce Hvozdnice |
| Schvalovatel | Zastupitelstvo obce Hvozdnice |
| Datum a forma schválení | 27.10. 2021 na jednání Zastupitelstva obce Hvozdnice |
| Doba realizace | 2021-2030 |
| Odpovědnost za realizaci | Zastupitelstvo obce Hvozdnice |

| | |
|--------------------------|--|
| Název | Akční plán rozvoje obce Hvozdnice na r. 2022 |
| Gestor | Starosta obce Hvozdnice |
| Schvalovatel | Zastupitelstvo obce Hvozdnice |
| Datum a forma schválení | 30. 3. 2022 na jednání Zastupitelstva obce Hvozdnice |
| Doba realizace | 2022 |
| Odpovědnost za realizaci | Zastupitelstvo obce Hvozdnice |


Způsob zpracování

1. Průběžné hodnocení plnění v r. 2022 (prostředí, zdroje, vztahy, potřeby, rizika)
2. Zpracování návrhu hodnocení plnění Akčního plánu rozvoje obce na r. 2022
3. Diskuse se členy OZ na pracovní poradě (náměty, připomínkování dokumentu)
4. Předložení dokumentu k projednání do OZ

Rekapitulace priorit dle Rozvojového plánu obce na r. 2021-30


Priorita 1 Zdravé prostředí a kvalitní infrastruktura

Priorita je zaměřena na modernizaci dopravní a technické infrastruktury v obci, zlepšení kvality životního prostředí a vzhledu obce.

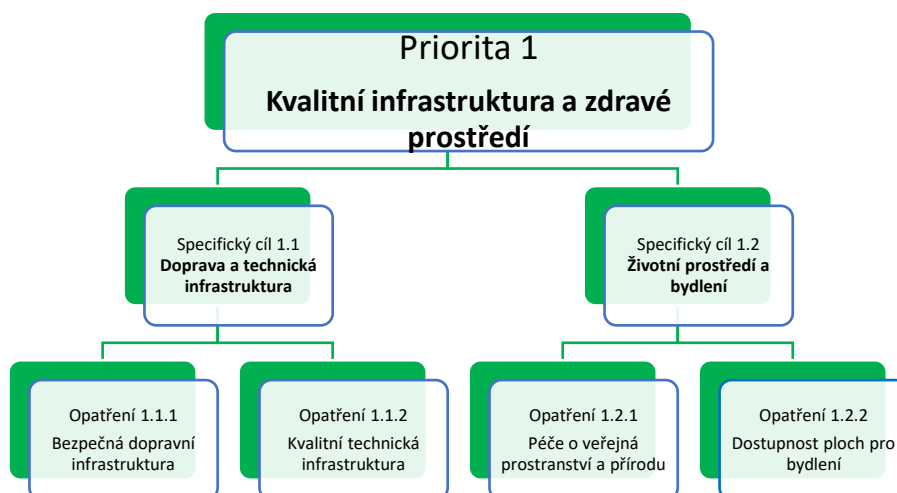

Priorita 2 Život v obci a komunita

Priorita je zaměřena na zvyšování kvality života místních obyvatel, společenský rozvoj obce, zvýšení dostupnosti základních služeb a zkvalitňování místní veřejné správy.

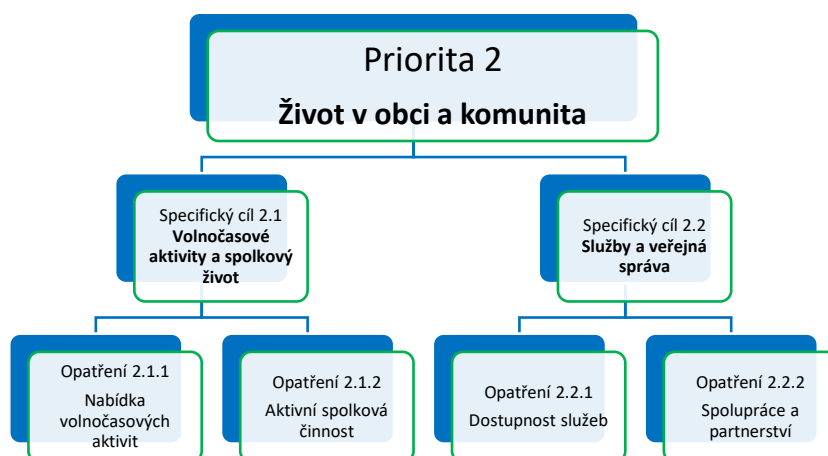

Hodnocení plnění Akčního plánu rozvoje obce na r. 2022

Jednotlivé záměry byly plněny ve vazbě na vyčleněné finanční prostředky z rozpočtu obce. Souběžně byly plněny i aktivity nefinančního charakteru, které sice nejsou obsahem jednotlivých záměrů AP 2022, ale patří do souboru aktivit zmiňovaných v RPO. U jednotlivých záměrů je provedeno stručné vyhodnocení jejich stavu k 31. prosinci 2022. Rozhodující část realizace AP 2022 byla směřována do oblasti Priorita 1 s cílem zlepšení infrastruktury obce jako základu pro další zlepšování životního prostředí a zvyšování kvality života v obci.

Detailní hodnotící tabulka (plnění k 31.12.2022)

| Aktivita / postupový krok | Termín dokončení | Rozpočtové náklady dle ÚRS (tis. Kč bez DPH) | Skutečné náklady (tis. Kč) | Komentář – aktuální stav plnění, návrhy na opatření | Status aktivity |
|--|------------------|--|----------------------------|--|---|
| Oprava místních komunikací Hvozdnice | 9/2022 | 4 888 | 4 836 | Navýšení původního rozpočtu – změna ceny asfaltových směsí, nákladů na dopravu, inflace – viz Dodatek č. 1 | Ukončena realizace, kolaudace 12/2022 |
| Dokončení a oprava veřejného osvětlení - Hvozdnice – v rozsahu specifikace 1. etapy | 4/2022 | 2 633 | 723 | Dokončena 1. etapa, tj. nové osvětlení vč. částečné rekonstrukce, 2. etapa – viz výhled pro r. 2023 | Ukončena realizace 1. etapy |
| Multifunkční sportovní hřiště a terénní úpravy na pozemku p. č. 13 v k. ú. Hvozdnice | - | - | - | Ve fázi připravené projektové dokumentace a platného stavebního povolení, na úrovni OZ schváleno podání žádosti o dotaci z POV | V řešení zajištění finančních zdrojů na realizaci |
| Rekonstrukce OÚ, pohostinství a kulturního sálu | - | 07/22 | 69 | Rekonstrukce OÚ zůstává ve fázi prvotního záměru k dalšímu jednání, v rámci | Realizace dvou dílčích opatření ukončena, |

| | | | | | |
|---|----------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--|
| | | | | realizace opatření k úsporám byl pro objekt pohostinství, připraven návrh na zateplení stropu a v objektu OÚ proběhla zatím výměna vrat u přilehlé garáže | rekonstrukce OÚ a kulturního sálu zůstává k dalšímu projednání |
| Rekonstrukce prodejny potravin | - | - | - | Ve fázi prvotního záměru | K dalšímu projednání |
| Pokrytí obce vysokorychlostním internetem | 5/2022 | K tíži budoucího provozovatele | K tíži budoucího provozovatele | Program NGA 2020 (MPO ČR) - doplnění možností o připojení na Internet přes kabelové připojení od CETIN | Splněno - zvýšení dostupnosti Internetu v obci |
| Úprava plochy u místní prodejny | 5/2022 | 136 | 136 | Realizace v čase, rozpočtu i kvalitě. | Splněno |
| Intenzifikace ČOV Libčany | Přelom 2024/25 | 4 000 | 0 | Podepsaná smlouva na příspěvek, probíhají proj. práce, platba 2 mil. Kč (2023) a 2 mil. Kč (2024). Příprava realizace na straně vlastníka. | Plněno - příprava realizace na straně vlastníka a dodavatele prací |
| Rekonstrukce kuchyně v objektu pohostinství | 8/2022 | 700 | 710 | Součástí akce vybavení kuchyně (realizace dle VŘ), tak i stavební práce a dodatečné úpravy v objektu související s instalací technologie | Splněno |

Záměry pro zařazení do AP 2023 v souladu s RPO 2021-30

Základem pro Akční plán pro rok 2023 zůstávají otevřené aktivity uvedené v platné verzi zásobníku záměrů a projektů. Vzhledem ke skutečnosti, že u některých dosud není uzavřen prvotní odhad možných nákladů na realizaci, budou další záměry, které by vyžadovaly čerpání z rozpočtu pro rok 2023 event. z budoucí dispozice rozpočtového výhledu na r. 2024-25, doplněny při finalizaci AP na r. 2023. Při zajišťování finančních prostředků budou i nadále vyhledávány další zdroje mimo rozpočet obce (státní dotace, dotace z fondů EU).

Zdroje

- Rozvojový plán obce Hvozdnice na období 2021-30, Centrum investic, rozvoje a inovací Hradec Králové, 2021
- Akční plán rozvoje obce Hvozdnice na r. 2022 schválený na jednání OZ 30.3.2022
- Podklady z výběrových řízení a realizace příslušných záměrů, smluvní dokumentace a usnesení OZ v období 01-12/2022

Zkratky

| | |
|--------------|--|
| AP | Akční plán |
| ČOV | Čistírna odpadních vod |
| k. ú. | Katastrální území |
| MPO | Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR |
| POV | Program obnovy venkova |
| OZ | Obecní zastupitelstvo / Zastupitelstvo obce |
| RPO | Rozvojový plán obce |
| ÚRS (CS ÚRS) | Cenová soustava ÚRS - ucelený systém informací, metodických návodů a postupů pro stanovení ceny stavebního díla. |
